

Projektstrukturplan


Das Projekt oben, darunter die Teilprojekte, unter jedem Teilprojekt seine Arbeitspakete. Jedes Arbeitspaket bekommt einen Code, ein Ergebnis und eine verantwortliche Person (Seite mit der Liste).

Auftraggeber

Projektleitung

Stand

Gliederung (nach Phasen, Objekten oder Funktionen)

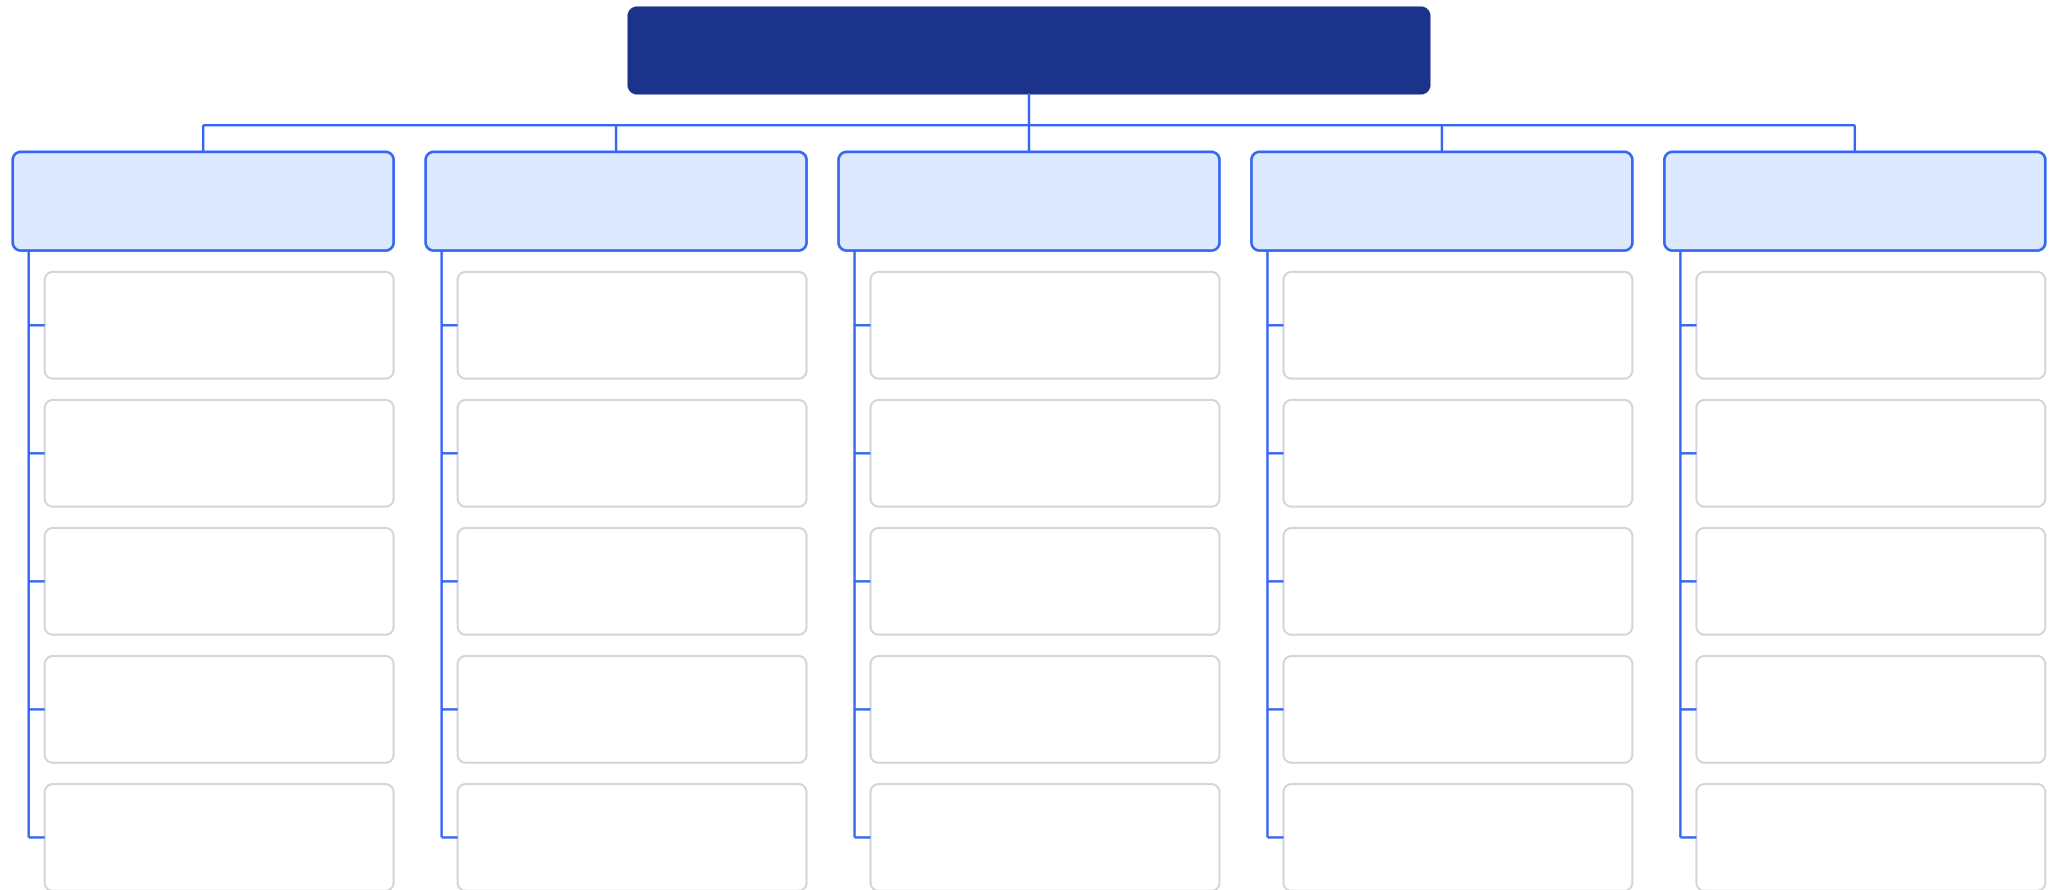

 Projekt (Ebene 1)

 Teilprojekt (Ebene 2)

 Arbeitspaket (Ebene 3)

 Meilenstein

Stunden: beim Arbeitspaket der Aufwand, beim Teilprojekt die Summe darunter.

Projektstrukturplan als Liste

Alle Elemente mit Code, Ergebnis, Verantwortlichen, Aufwand und Kosten. Bei Teilprojekten die Summe der Arbeitspakete darunter eintragen, unten nur die Arbeitspakete summieren.

[illegible]

Projektstrukturplan

Das Projekt oben, darunter die Teilprojekte, unter jedem Teilprojekt seine Arbeitspakete. Jedes Arbeitspaket bekommt einen Code, ein Ergebnis und eine verantwortliche Person (Seite mit der Liste).

Auftraggeber	Projektleitung	Stand	Gliederung (nach Phasen, Objekten oder Funktionen)
Weber GmbH	Sarah Klein	26.10.2026	nach Phasen, Projektmanagement als eigener Zweig



■ Projekt (Ebene 1) ■ Teilprojekt (Ebene 2) □ Arbeitspaket (Ebene 3) ■ Meilenstein Stunden: beim Arbeitspaket der Aufwand, beim Teilprojekt die Summe darunter.

Projektstrukturplan als Liste

Alle Elemente mit Code, Ergebnis, Verantwortlichen, Aufwand und Kosten. Bei Teilprojekten die Summe der Arbeitspakete darunter eintragen, unten nur die Arbeitspakete summieren.

Projekt		Projektleitung		Stand	Stundensatz für die Kosten (€)	
Website-Relaunch Weber GmbH		Sarah Klein		26.10.2026	110,00	
PSP-Code	Bezeichnung	Typ	Verantwortlich	Ergebnis / Liefergegenstand	Aufwand (Std)	Kosten (€)
1	Website-Relaunch Weber GmbH	Projekt	S. Klein	Neue Website live, alte Adressen weitergeleitet	420	48.000,00
1.1	Projektmanagement	Teilprojekt	S. Klein	Projekt gesteuert, dokumentiert, übergeben	60	6.600,00
1.1.1	Kick-off und Projektsteckbrief	Arbeitspaket	S. Klein	Freigegebener Projektsteckbrief	12	1.320,00
1.1.2	Steuerung und Statusberichte	Arbeitspaket	S. Klein	Statusbericht alle zwei Wochen	40	4.400,00
1.1.3	Abschluss und Übergabe	Arbeitspaket	S. Klein	Übergabeprotokoll, Abschlussbericht	8	880,00
1.2	Konzept	Teilprojekt	J. Neumann	Abgestimmtes Konzept	68	7.480,00
1.2.1	Analyse Website und Zugriffszahlen	Arbeitspaket	J. Neumann	Analyse mit Empfehlungen	24	2.640,00
1.2.2	Sitemap und Seitentypen	Arbeitspaket	J. Neumann	Abgestimmte Sitemap	16	1.760,00
1.2.3	Wireframes	Arbeitspaket	J. Neumann	Wireframes für sechs Seitentypen	28	3.080,00
1.2.4	Konzept abgenommen	Meilenstein	A. Weber	Schriftliche Freigabe der Weber GmbH		
1.3	Design	Teilprojekt	M. Yilmaz	Freigegebene Layouts	92	11.320,00
1.3.1	Designentwurf Startseite	Arbeitspaket	M. Yilmaz	Entwurf in zwei Varianten	32	3.520,00
1.3.2	Designs der Unterseiten	Arbeitspaket	M. Yilmaz	Layouts aller Seitentypen, mobil und Desktop	52	5.720,00
1.3.3	Bildauswahl und Lizenzen	Arbeitspaket	M. Yilmaz	Bildpaket mit Nutzungsrechten	8	2.080,00
1.4	Umsetzung	Teilprojekt	T. Becker	Website auf der Testumgebung	156	17.760,00
1.4.1	CMS und Hosting einrichten	Arbeitspaket	T. Becker	Testumgebung erreichbar	16	2.360,00
1.4.2	Seitenvorlagen programmieren	Arbeitspaket	T. Becker	Alle Seitentypen im CMS	88	9.680,00
1.4.3	Inhalte einpflegen	Arbeitspaket	J. Neumann	Alle Seiten befüllt	40	4.400,00
1.4.4	Weiterleitungen alter Adressen	Arbeitspaket	T. Becker	Weiterleitungsliste umgesetzt	12	1.320,00
1.5	Test und Livegang	Teilprojekt	S. Klein	Website live und abgenommen	44	4.840,00
1.5.1	Test auf Geräten und Browsern	Arbeitspaket	T. Becker	Testprotokoll ohne offene Fehler	24	2.640,00
1.5.2	Schulung der Redaktion	Arbeitspaket	S. Klein	Zwei Personen geschult	8	880,00
1.5.3	Livegang und Nachbetreuung	Arbeitspaket	T. Becker	Website öffentlich, vier Wochen betreut	12	1.320,00
1.5.4	Abnahme durch Weber	Meilenstein	A. Weber	Abnahmeprotokoll unterschrieben		
Summe der Arbeitspakete (ohne Teilprojekt-Zeilen, sonst zählt alles doppelt)					420	48.000,00
